

prevision.

Gestão eficiente de obras

+



“O Waze da construção”

Paula Lunardelli



Engenheira civil

Especialista em negócios imobiliários



CEO & Founder da Prevision




Diretora da Vertical
Construtech ACATE



A primeira plataforma integrada de planejamento e gestão de obras com o conceito LEAN.






Outras soluções

VS


Visão centralizada
do melhor cenário

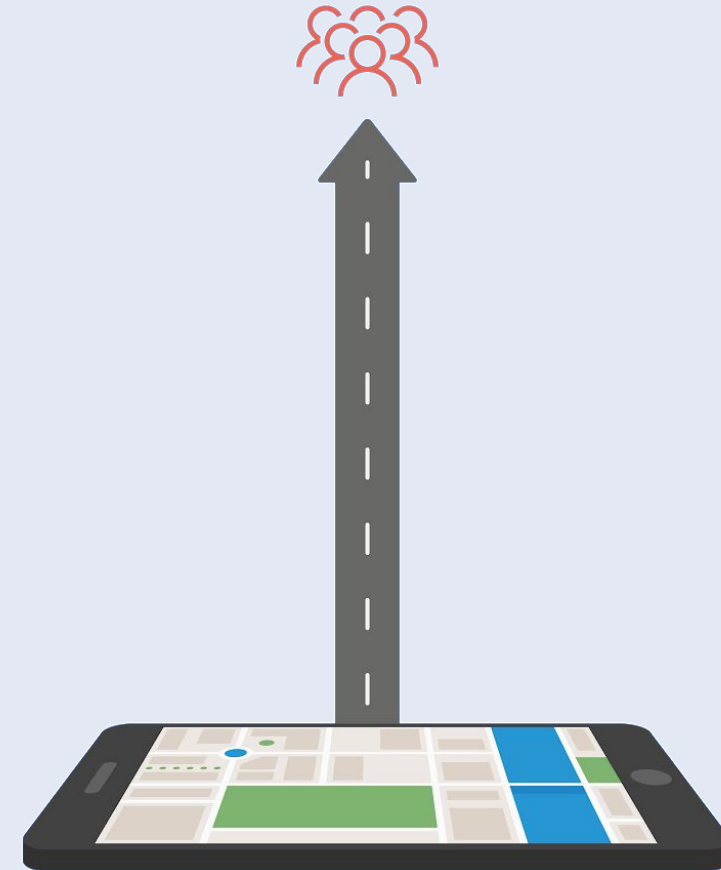

preVISION.

Funcionalidades Prevision: Planejamento em Linha de Balanço

Serviços com relações de dependência

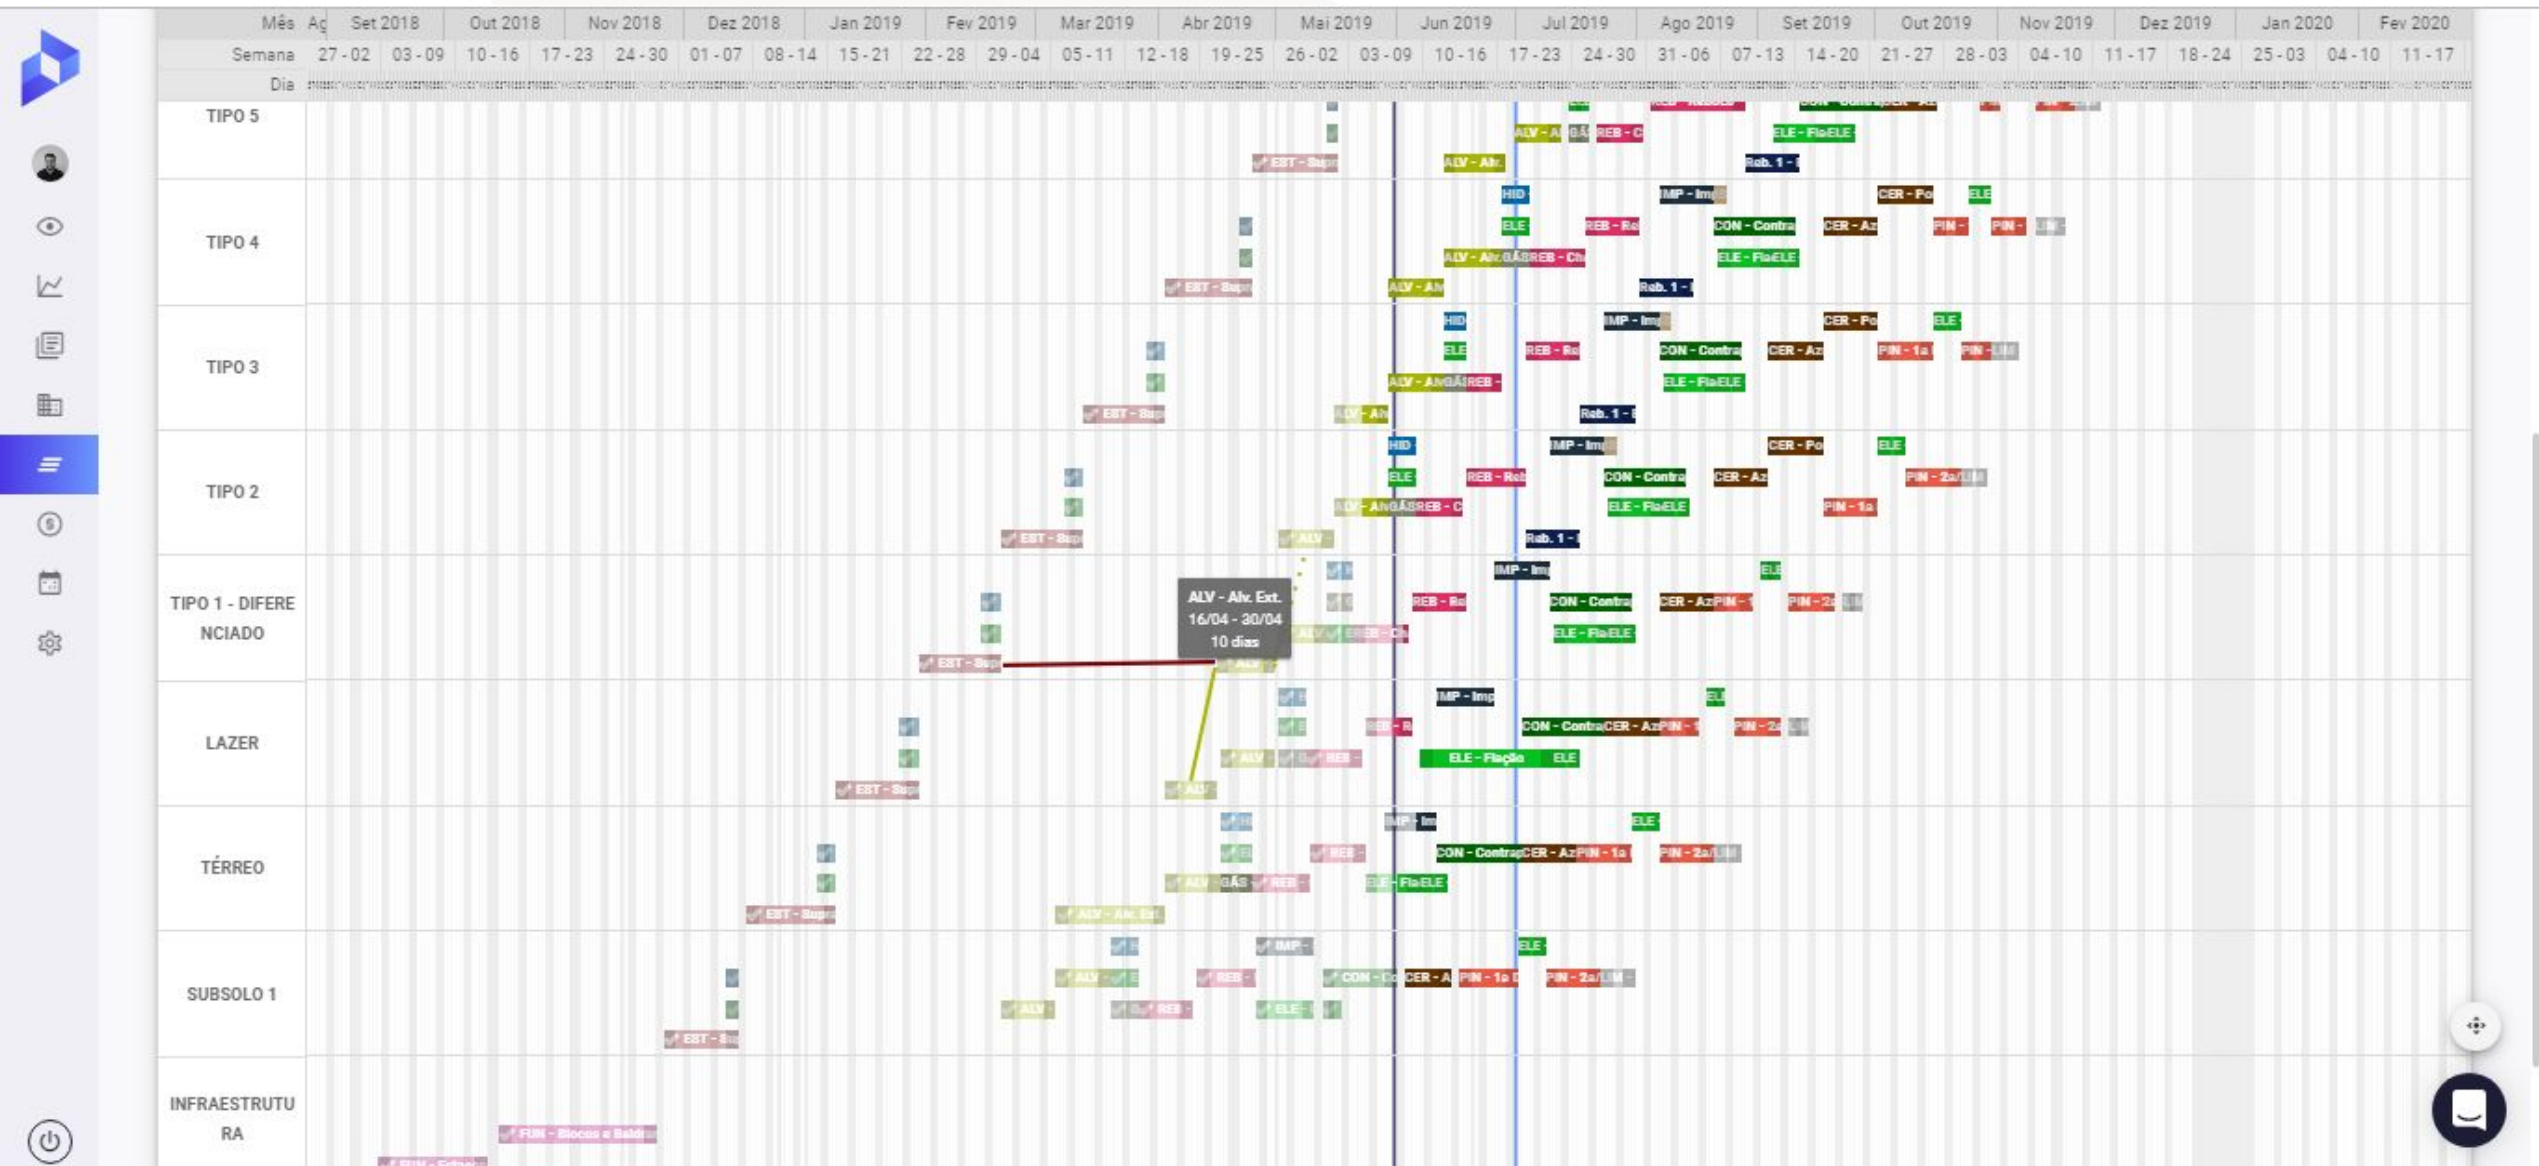

Funcionalidades Prevision: Comunicação entre áreas

☰ DATAS ▾ SERVIÇOS ▾ PAVIMENTOS ▾

☰ Tarefas ☰

DATAS ▾ ESTADO ▾ RESPONSÁVEIS ▾

🔍 Buscar +

25/03/2019

Alvenaria Subsolo
🚫 Comprar bloco cerâmico
👤 👤

27/11/2019

Esquadrias Subsolo
🚫 Cotação Esquadrias
👤

Mês	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Set 2019	Out 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan
Semana	- 03 04 - 10	11 - 17 18 - 24	25 - 31 01 - 07 08 - 14	15 - 21 22 - 28	29 - 05 06 - 12 13 - 19	20 - 26		
Dia	[Placeholder for daily data]							
CM/Res.		Estrutura		Alvenaria	Elét. Pa. Hidr. Pa. Reboco Contra. Fiação			
Tipo 3		Estrutura		Alvenaria	Elét. Pa. Hidr. Pa. Reboco Contra. Fiação			
Tipo 2			Alvenaria		Elét. Pa. Hidr. Pa. Reboco Contra. Fiação		Forro de gesso	
Tipo 1		Alvenaria			Elét. Pa. Hidr. Pa. Reboco Contra. Fiação		Forro de gesso	
Térreo				Elét. Pa. Hidr. Pa. Reboco Contra. Fiação		Forro de gesso		
Subsolo				Elét. Pa. Hidr. Pa. Reboco Contra. Fiação	Forro de gesso	Pintura		



Funcionalidades Prevision: Clareza nas metas semanais

← Exportar cronograma EXPORTAR

DATAS ▾ SERVIÇOS ▾ PAVIMENTOS ▾

Buscar

Data de referência: 29 Nov 20

Esta data é utilizada para a realização da obra

Informações


- ID
- Serviço
- Pavimento
- Data de início
- Data de término
- Custo

- ESTRUTURA
- ALVENARIA
- ELÉT. PAREDE
- REBOCO INTERNO
- CONTRAPISO
- FORRO DE GESSO
- PINTURA
- ESQUADRIAS

Serviço	Local	Data de início	Data de término	Última medição (%)			Referência (%)				
				Data	Base	Previsto Realizado	Data	Base	Previsto Realizado		
Alvenaria	Subsolo	05/04/2019	06/05/2019	22/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Alvenaria	Térreo	07/05/2019	03/06/2019	22/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Alvenaria	Tipo 1	05/06/2019	03/07/2019	24/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Alvenaria	Tipo 2	04/07/2019	31/07/2019	24/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Alvenaria	Tipo 3	01/08/2019	28/08/2019	24/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Alvenaria	CM/Res.	29/08/2019	25/09/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Contrapiso	Subsolo	19/08/2019	30/08/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Contrapiso	Térreo	02/09/2019	13/09/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Contrapiso	Tipo 1	16/09/2019	27/09/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Contrapiso	Tipo 2	30/09/2019	11/10/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Contrapiso	Tipo 3	14/10/2019	25/10/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Contrapiso	CM/Res.	28/10/2019	08/11/2019	31/10/2019	100	40	100	29/11/2019	100	100	100
Elét. Parede	Subsolo	22/07/2019	02/08/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Elét. Parede	Térreo	05/08/2019	16/08/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Elét. Parede	Tipo 1	19/08/2019	30/08/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Elét. Parede	Tipo 2	02/09/2019	13/09/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Elét. Parede	Tipo 3	16/09/2019	27/09/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100
Elét. Parede	CM/Res.	30/09/2019	11/10/2019	31/10/2019	100	100	100	29/11/2019	100	100	100



Funcionalidades Prevision: Flexibilidade de EAP



Rafael Dal Moro

OBRA 5 - Exemplo
Selecionar projeto

Admin

Dashboard

Relatórios

Projetos

Cronograma

Orçamento

Calendário

Configurações

ORÇAMENTO | VINCULAR CRONOGRAMA

Q Buscar

Código	Descrição	Total (R\$)	Vinculado	Selecionado
01	SERVIÇOS GERAIS	1.300.000,00	↓	<input type="checkbox"/>
02	FUNDAÇÃO	1.550.000,00	↓	<input type="checkbox"/>
03	ESTRUTURA	2.500.000,00	↓	<input type="checkbox"/>
04	ALVENARIA	1.650.000,00	↓	<input type="checkbox"/>
05	INSTALAÇÕES	3.275.000,00	↓	<input type="checkbox"/>
05.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	825.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.137.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.03	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.137.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.04	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	175.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA	3.855.000,00	↓	<input type="checkbox"/>

Total: R\$ 20.710.000,00

Linhas por página: 10 1-10 de 16 < > Nível de detalhamento: 1 2 3 4 5

Q Buscar

Utilizar a descrição do orçamento para encontrar o pavimento referente ao serviço

- Serviços Gerais
- Inst. Canteiro
- FUN - Estacas
- FUN - Blocos e Baldrames
- EST - Superestrutura
- ALV - Alv. Ext.
- ALV - Alv. Int.
- ELE - Infra. Laje
- ELE - Tub. Parede
- ELE - Fiação

1-10 de 45 < >



Funcionalidades Prevision: Dashboard por obra

Índices Base x Previsto indicando obra replanejada

preVISION.

Rafael Dal Moro

OBRA 5 - Exemplo
Selecionar projeto

Admin

Dashboard

Relatórios


Projetos

Cronograma


Orçamento

Calendário

Configurações

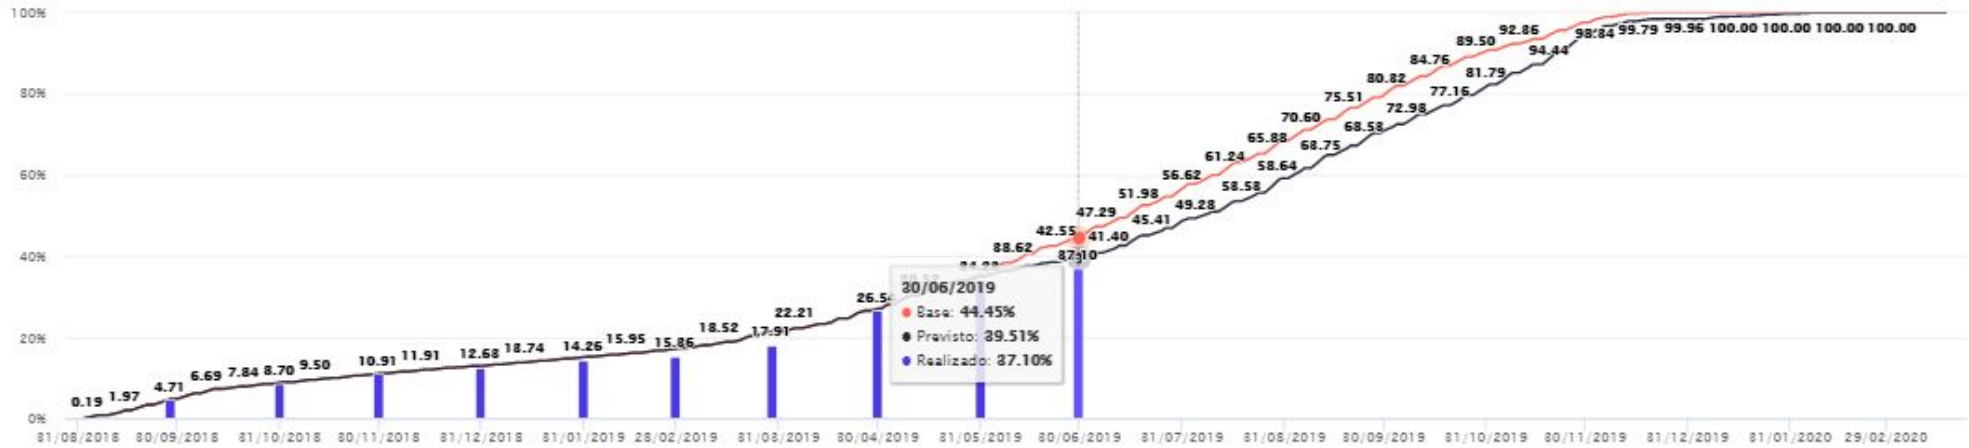


Evolução mensal

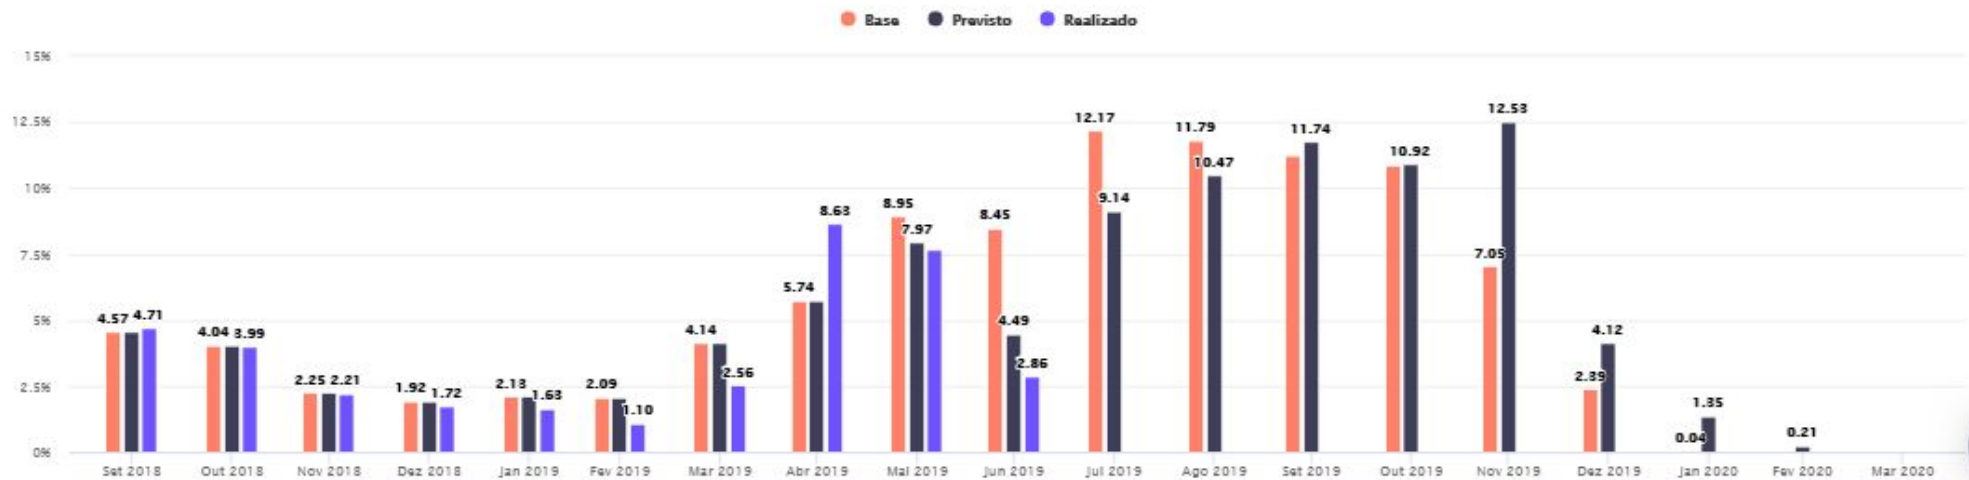

Funcionalidades Prevision: Relatórios e Dashboard Consolidada


5 PROJETOS ▾ CONSOLIDADO ▾ PERCENTUAL (%) ▾

Gráficos consolidados

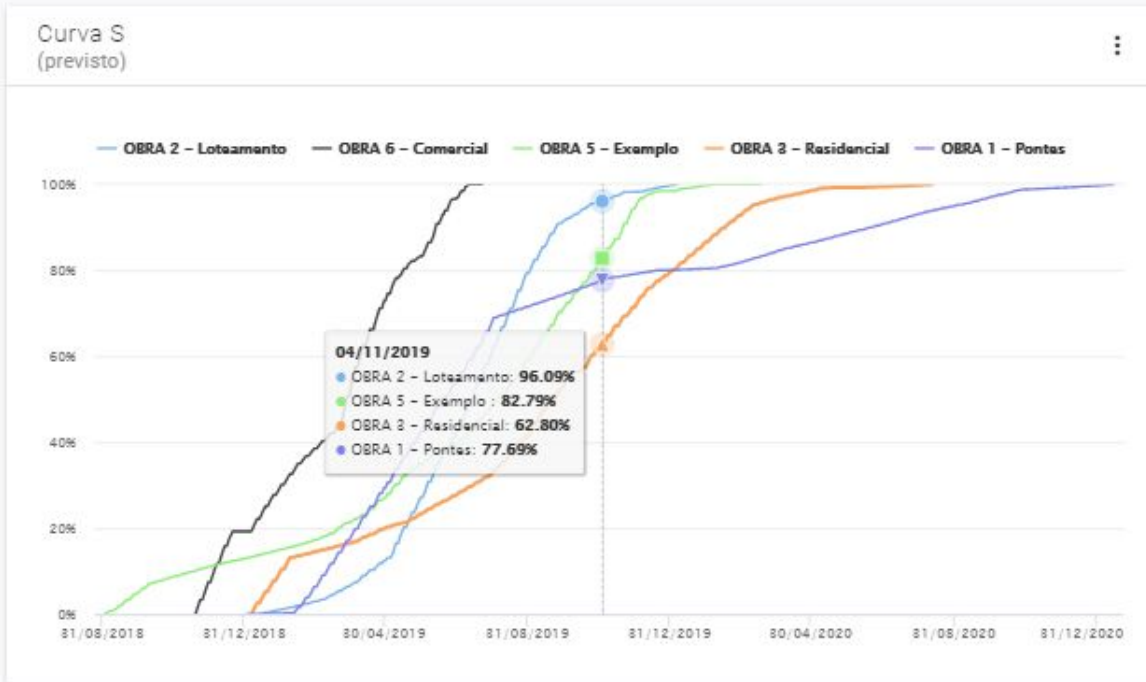


Status na última medição

(na ausência de medição será considerada a data de hoje)

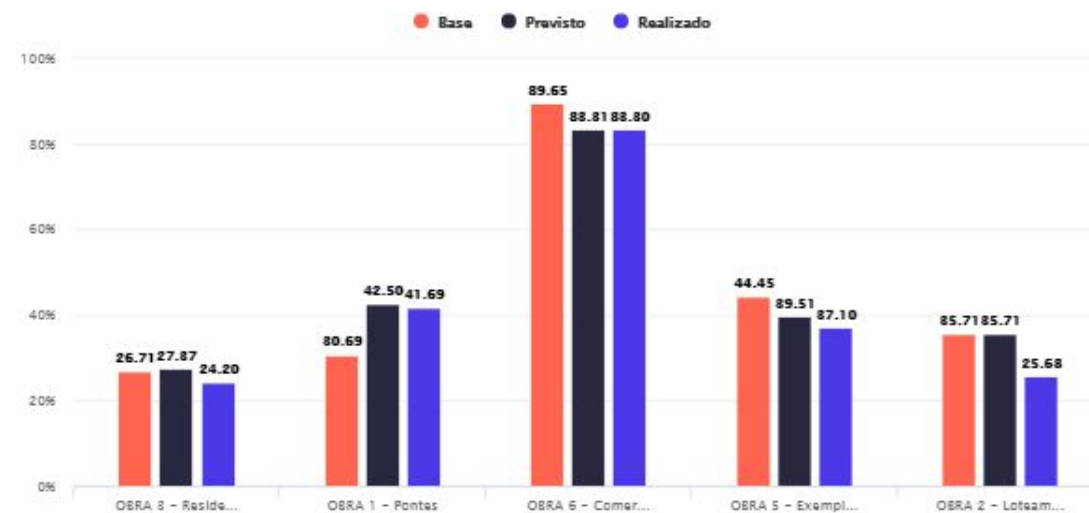

Resumo dos projetos



Funcionalidades Prevision: Foco no sucesso do cliente

Como fazer edição em massa das atividades - multisseleção

Aprenda a editar em massa a duração das atividades, a posição das atividades nos pavimentos e as relações de dependência dos serviços.



Escrito por Isabela
Atualizado há mais de uma semana

02
14
Olá Paula

Iniciar uma conversa
🔊 Volta em 2h


Nova conversa

Encontre rapidamente uma resposta

Busque respostas... >

Artigos mais acessados



Usamos a tecnologia da Intercom

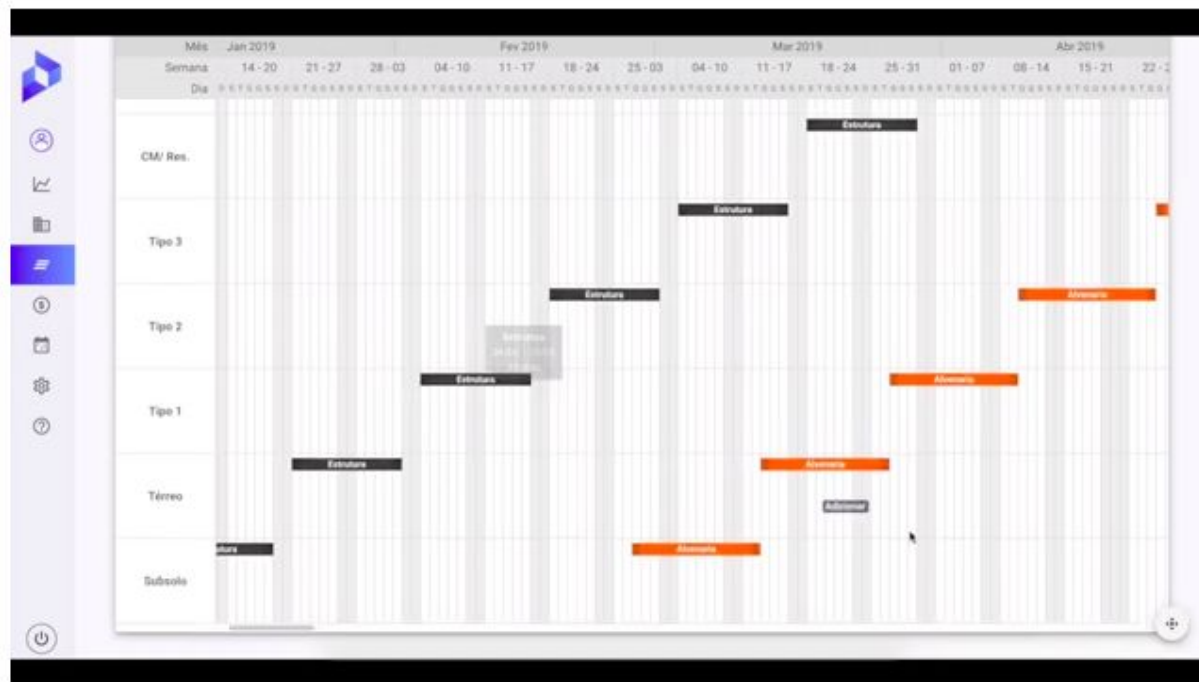




Diferenciais prevision.

20x mais agilidade

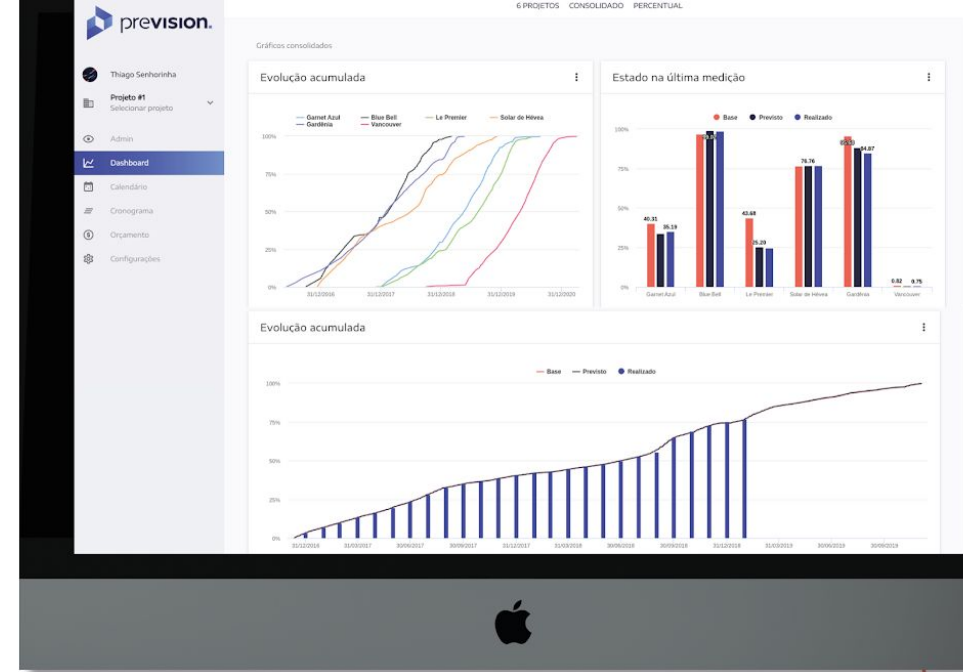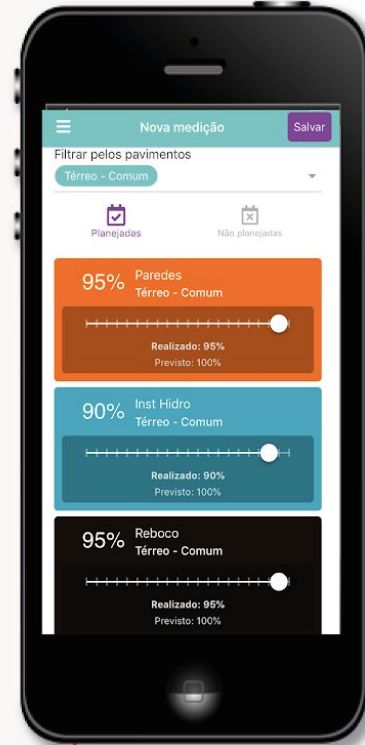

Previsibilidade em uma tela

Comunicação com o canteiro

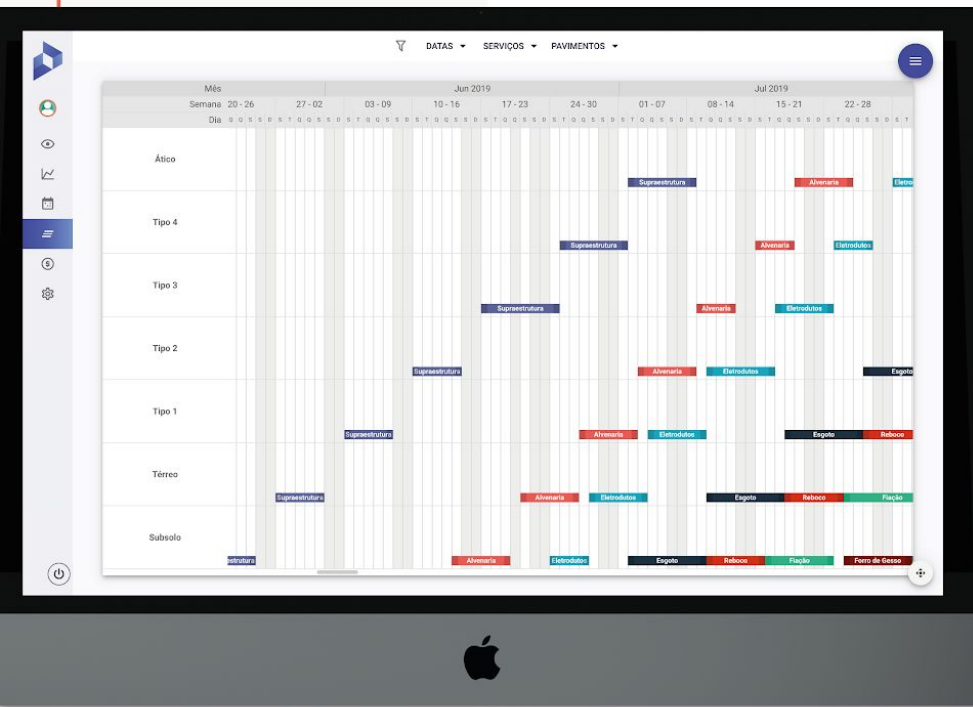

OS MELHORES CLIENTES

“Com Prevision fazemos o planejamento em 10% do tempo de antes” **Pedra Branca**

“Hoje temos a previsão da evolução físico-econômica e atualização praticamente em tempo real” **Porto 5**

“Visão facilitada dos vários cenários de planejamento” **Axia**

“Previsibilidade com uma forma assertiva de fazer” **RDO**

170+ obras
12 estados
+ DF



PARCEIROS



“A plataforma uniu os conceitos de planejamento à tecnologia de maneira inovadora, o que fez todo sentido para nós e nossos clientes!

Nauana Franco



PRONTO PARA DOMINAR SUA OBRA HOJE?

Paula Lunardelli
CEO

paula@prevision.com.br
+55 48 99971-5000

PARCEIROS:



cte

centro de tecnologia
de edificações

GRITECH
CLUB.

